

ХҮҮХДИЙН ЗУСЛАН БАЙГУУЛАХ, 100 ХҮҮХЭД /ДОРНОГОВЬ АЙМАГ, САЙНШАНД СУМ/



Хүчин чадал: Амрагч хүүхдийн байр-28 ш, багш ажилчдын байр-4ш, Зоогийн газар болон урлаг танхим, нийтийн ариун цэврийн байр, душ, анхан шатны тусламжийн байр, задгай тайз, зам талбай, тохижилт

Гүйцэтгэгч: “Энержи парагон” ХХК

Зураг төсөл зохиогч: “Шигота” ХХК

Гэрээний дүн: 1 589 691 101 төгрөг

Гэрээний эхлэх, дуусах огноо:

2020 оны 09 дүгээр сарын 04-ний өдөр

2021 оны 08 дугаар сарын 10-ны өдөр

Гэрээний сунгалт:

2021 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдөр



Ажлын явц: Амрагч хүүхдийн 21 байр, ажилчдын байр-4ш, хооллох танхим, нийтийн ариун цэврийн байр, нийтийн халуун ус, анхны тусламжийн барилгын угсралтын ажил дуусч, дотор цахилгаан, дотор заслалын ажлууд хийгдэж байгаа бөгөөд ажлын явц 85%-тай. Амрагч хүүхдийн 7 ш байрны модон материал /дүнз/-ыг дотоодын нийлүүлэгчээс авахаар 7-р сард гэрээ байгуулсан боловч цаг агаарын нөхцөл байдал /бороо, үер ус/-аас шалтгаалж мод бэлтгэл, тээвэрлэлт саатсан. Одоогоор 7 барилгын модон материалыг Улаанбаатар хотоос татах ажил хийгдэж байна.

Тулгамдаж буй асуудал: Тус барилга нь УТ-ийн 1.6 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгөөр баригдаж буй бөгөөд 2020 онд УТ-өөс 500.0 сая төгрөгийн санхүүжилт олгох байсан боловч тодотголоор 50.0 сая төгрөг болж буурсан. МУЗГ-ын 2020 оны 184-р тогтоолоор ойгоос бэлтгэх мод, түлээнд ногдуулах татвар нэмэгдэж, модон материалын үнэ өссөн, БХБС-ын 2019 оны 217-р тушаалаар “Барилгын ажилчдын тарифт цалингийн жишиг”, 2020 оны 30-р тушаалаар Барилгын төсөв зохиох дүрэм /БНБД 81-95-12*/2020/-ыг тус тус шинэчлэн баталж 2021.01.01-ны өдрөөс мөрдөж эхэлсэн ба 2020-2021 он дамжин хэрэгжиж буй барилгууд нь хуучин мөрдөж байсан цалингийн тариф, төсвийн норм үнэлгээгээр төсөв өртөг нь батлагдсан тул тус барилгын хувьд хөрөнгө санхүүжилтийн дутагдалд орж байна. Гүйцэтгэгч компаниас модон материалын үнийн өсөлтийн зөрүүг нэмэлтээр шийдвэрлүүлэх хүсэлтийг холбогдох газруудад ирүүлсэн.

АХМАДЫН СУВИЛАЛЫН БАРИЛГА, 60 ОР /ДОРНОГОВЬ АЙМАГ, САЙНШАНД СУМ/



Хүчин чадал: Уг барилга нь зоорьгүй, тэнхлэгээрээ А блок нь 20.0x15.2м, В блок нь 12.8x15.2м, С блок нь 20.0x15.2м, D блок нь 19.2x12.8м харьцаатай 2 давхар, цутгамал төмөр бетон араг бүтээцтэй барилга

Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэгч:

“Элит конкрет” ХХК

Зураг төсөл зохиогч: “Идеал групп” ХХК

Гэрээний дүн: 4 399 893 174 төгрөг

Гэрээний эхлэх, дуусах огноо:

2021 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдөр

2022 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдөр

Ажлын явц: Барилгын газар шорооны ажил дуусч А, В, D блокын 1,2-р давхарын багана, дамнуруу, хучилтын цутгалтын ажил бүрэн хийгдсэн. Е блокын 1-р давхарын каркасан хийцийн бетон цутгалт хийгдээд байна. Гадна цахилгаан хангамжийн 10 кВ-ын 1.2 км агаарын шугам, 250 кВа хүчин чадалтай КТПН угсрах ажил хийгдсэн. 2021 онд батлагдсан 1.0 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийн хүрээнд төлөвлөсөн ажил хийгдсэн.

ХҮҮХДИЙН ПАРК БАЙГУУЛАХ АЖИЛ /ДОРНОГОВЬ АЙМАГ, САЙНШАНД СУМ/



Хүчин чадал: Үйлчилгээний барилга, Нийтийн бие засах газар, тасалбар худалдах цэгийн барилга, тоглоом /алсын харагч, далайн дээрэмчний завь, агаарын гинж, морин тойруулга, эргэдэг аяга, мөргөлддөг машин/, гадна зам талбайн, гэрэлтүүлэг, хиймэл нуур, тохижилт ногоон байгууламж/

Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэгч:

“Дэлгэр баясах зам” ХХК

Зураг төсөл зохиогч: “Архидеа” ХХК

Гэрээний дүн: 5 438 700 000 төгрөг

Гэрээний эхлэх, дуусах огноо:

2021 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдөр

2022 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдөр

Ажлын явц: Үйлчилгээний барилгын А болон Б блокын төмөр бетон араг бүтээцийн угсралтын ажил бүрэн хийгдэж дууссан, Б блокын гадна блокон хана, дотор тоосгон хамар ханын өргийн ажил хийгдэж байна. Нийтийн бие засах газар болон тасалбар түгээх барилгуудын суурь, гадна 380 мм-ийн тоосгон хана, хучилтын цутгалтын ажил хийгдсэн. Мөн бохир усны цооногын цутгалт, гүний худгийн өрөмдлөгийн ажил хийгдсэн. Гадна цахилгааны кабель шугам татах, КТПН угсрах ажил хийгдсэн. Гадна бохир усны шугам, цэвэр усны шугам, худгийн ажлууд үргэлжлэн хийгдэж байна. Гадна төмөр сараалжин хашааны 3 тал хэсэг хийгдээд байна. Уг ажлыг түлхүүр гардуулах нөхцөлтэйгээр гүйцэтгэж байгаа бөгөөд зураг төслийг магадлалаар хянуулах ажил хийгдэж байгаагаас шалтгаалан тухайн оны санхүүжилтийн гүйцэтгэл гаргах ажил хүлээгдэж байна.

САРАН ХӨХӨӨ ТЕАТРЫН БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖИЛ /ДОРНОГОВЬ АЙМАГ, САЙНШАНД СУМ/



Хүчин чадал: 700 хүний суудалтай
Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэгч:
“Болор-Аграмба” ХХК
Зураг төсөл зохиогч: “ТГТ” ХХК
Гэрээний дүн: 9 405 588 888 төгрөг
Гэрээний эхлэх, дуусах огноо:
2021 оны 06 дугаар сарын 15-ний өдөр
2022 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдөр

Ажлын явц: Суурийн бетон цутгалтын ажил, булалтын ажил бүрэн хийгдэж дууссан. Хүйтний улирал эхэлсэн тул барилгын ажилд технологийн зогстол хийсэн.



СУРГУУЛИЙН БАРИЛГЫН ӨРГӨТГӨЛ, 320 ХҮҮХЭД /ДОРНОГОВЬ АЙМАГ, САЙНШАНД СУМ/



Хүчин чадал: Сургуулийн барилга нь тэнхлэгээрээ 39.2x16.0м, 21.0x13.5м хэмжээтэй, 3 давхар, 320 хүний суудалтай

Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэгч:
“Жинсийн орой” ХХК

Зураг төсөл зохиогч: “ТГТ” ХХК

Гэрээний дүн: 3 040 315 368 төгрөг

Гэрээний эхлэх, дуусах огноо:

2020 оны 07 дугаар сарын 30-ны өдөр

2020 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдөр

Гэрээний сунгалт:

2021 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр



Ажлын явц: Барилгын 1,2,3 дугаар давхрын төмөр бетон багана, дамнуруу, хучилт, карказ хийцийн цутгалтын ажил бүрэн дууссан. А блокын гадна дүүргэгч хана, хөөсөнцөр дулаалга, 120мм-ийн тоосгон хашлага ханын өрөг хийгдэж дууссан, хамар ханын тоосгон ханы өрөг хийгдэж байна. Мөн Б блокын гадна дүүргэгч хана, өнгөлгөөний 120мм-ийн тоосгон хана, Спорт заалны хэсгийн гадна блокон хананы өргийн ажил хийгдэж байна.

Ажлын гүйцэтгэлийг эрчимжүүлэх талаар Гүйцэтгэгч компани, БШУЯам, Барилгын хөгжлийн төвд шаардлага, санал хүсэлтийг хүргүүлэн ажиллаж байна.

500 ХҮНИЙ СУУДАЛТАЙ СОЁЛ УРЛАГЫН ОРДНЫ БАРИЛГА /ДОРНОГОВЬ АЙМАГ, ЗАМЫН-ҮҮД СУМ/



Хүчин чадал: Соёл урлагын ордны барилга нь тэнхлэгээрээ 46.0x45.0м хэмжээтэй, хагас зоорьтой, 2 давхар, 500 хүний суудалтай

Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэгч:

“РСТ” ХХК, “СИЗУ” ХХК түншлэл

Зураг төсөл зохиогч: “Өлзий иш” ХХК

Гэрээний дүн: 6 725 839 421 төгрөг

Гэрээний эхлэх, дуусах огноо:

2021 оны 08 дугаар сарын 20-ны өдөр

2022 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдөр



Ажлын явц: Суурийн бетон цутгалтын ажил, булалтын ажил бүрэн хийгдэж дууссан. Хүйтний улирал эхэлсэн тул барилгын ажилд технологийн зогстол хийсэн.

ЭРДЭНЭ СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН ӨРГӨТГӨЛИЙН БАРИЛГА БАРИХ АЖИЛ



Хүчин чадал: Барилга нь тэгш өнцөгт хэлбэртэй, тэнхлэгээрээ 12.0х27.0м хэмжээтэй, цутгамал шугаман суурьтай, тоосгон өрөгт даацын ханатай, хавтгай хуйлмал дээвэртэй 1 давхар барилга

Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэгч:
“БЭМЭС” ХХК

Зураг төсөл зохиогч: “Сант номун” ХХК

Гэрээний дүн: 522 453 507 төгрөг


Гэрээний эхлэх, дуусах огноо:

2021 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдөр

2022 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдөр



Ажлын явц: Суурийн бетон цутгалтын ажил, булалтын ажил бүрэн хийгдэж дууссан. Хүйтний улирал эхэлсэн тул барилгын ажилд технологийн зогстол хийсэн.

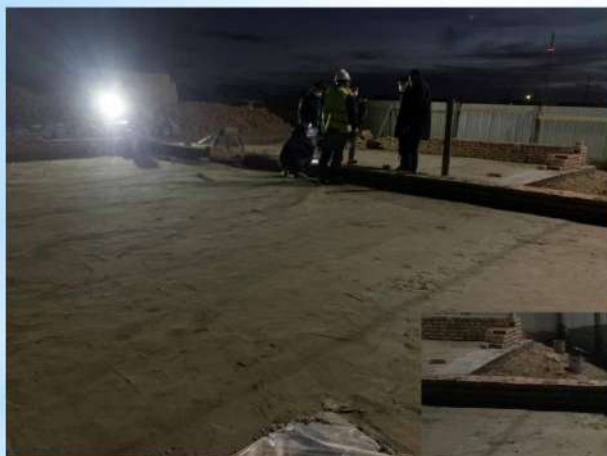

Хүчин чадал: Барилга нь тэнхлэгээрээ 12.0x16.0м хэмжээтэй, цутгамал шугаман суурьтай, тоосгон өрөгт даацын ханатай, долгионт төмөр налуу дээвэртэй 1 давхар барилга

Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэгч:

“Нанобриллиант констракшн” ХХК

Зураг төсөл зохиогч: “Сант номун” ХХК

Гэрээний дүн: 358 062 158 төгрөг

Гэрээний эхлэх, дуусах огноо:

2021 оны 10 дугаар сарын 01-ны өдөр

2022 оны 06 дугаар сарын 01-ны өдөр

Ажлын явц: Барилгын суурийн ажил бүрэн хийгдэж дууссан. Гадна ханын өргийн ажил хийгдэж байна.

Барилга
угсралт

САЙНШАНД СУМЫН 3-Р БАГТ ИРГЭДИЙН ХӨГЖЛИЙН ТӨВИЙН БАРИЛГА БАРИХ АЖИЛ



Хүчин чадал: Барилга нь тэгш өнцөгт хэлбэртэй, 15.0x12.0м хэмжээтэй, цутгамал шугаман суурьтай, тоосгон өрөгт даацын ханатай, хавтгай хуйлмал дээвэртэй 2 давхар барилга

Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэгч:

“Жи Ти Кэй Эс” ХХК

Зураг төсөл зохиогч: “Шигота” ХХК

Гэрээний дүн: 393 816 079 төгрөг

Гэрээний эхлэх, дуусах огноо:

2020 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдөр

2021 оны 07 дугаар сарын 01-ны өдөр



Ажлын явц: Барилгын ажил дуусч 2021.11.01-ний өдөр ашиглалтад хүлээн авах комисс ажилласан.

Шугам
сүлжээ

ДЭЛГЭРЭХ СУМЫН ТӨВИЙН ТӨВЛӨРСӨН ДУЛААН, ЦЭВЭР, БОХИР УСНЫ ШУГАМ СҮЛЖЭЭ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ БАРИХ АЖИЛ



Хүчин чадал: Уг инженерийн шугам сүлжээний ажил нь гадна дулаан, цэвэр усны шугам сүлжээ, ариутгах татуургын шугам, цэвэрлэх байгууламж, уурын зуухны барилга, 100м³ усан сан, ус түгээх байр, гүний худаг

Гүйцэтгэгч: “Чандмань-Илч” ХХК

Зураг төсөл зохиогч: “Мон Кузбасс” ХХК

Гэрээний дүн: 2 889 326 328 төгрөг

Гэрээний эхлэх, дуусах огноо:

2020 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдөр

2021 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр

Ажлын явц: Сумын төвийн төвлөрсөн дулаан, цэвэр, бохир усны шугам сүлжээ, барилга байгууламж барих ажил дуусч 2021 оны 10 дугаар сарын 08-ны өдөр ашиглалтад хүлээн авсан.

Шугам
сүлжээ

ДЭЛГЭРЭХ СУМЫН ТӨВЛӨРСӨН ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ 1.4 КМ ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ АЖИЛ



Хүчин чадал: Гүний худгаас 100 м³ усан сан хүртэлх 1.4 км цэвэр усны шугам

Гүйцэтгэгч: “Чандмань-Илч” ХХК

Зураг төсөл зохиогч: “Мон Кузбасс” ХХК

Гэрээний дүн: 127 164 000 төгрөг

Гэрээний эхлэх, дуусах огноо:

2021 оны 08 дугаар сарын 09-ны өдөр

2021 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр

Ажлын явц: Сумын төвийн төвлөрсөн шугам сүлжээ 1.4км цэвэр усны шугамын ажил дуусч 2021 оны 10 дугаар сарын 08-ны өдөр ашиглалтад хүлээн авсан.

Шугам
сүлжээ

ДЭЛГЭРЭХ СУМЫН ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ДОТОР САНТЕХНИКИЙН ЗАСВАР, ТӨВЛӨРСӨН ШУГАМД ХОЛБОХ ХОЛБОЛТЫН АЖИЛ



Гүйцэтгэгч: “Чандмань-Илч” ХХК

Зураг төсөл зохиогч: “Алтайн газрын хүч” ХХК

Гэрээний дүн: 193 568 100 төгрөг

Гэрээний эхлэх, дуусах огноо:

2021 оны 08 дугаар сарын 09

2021 оны 10 дугаар сарын 30



Ажлын явц: Сумын төсөвт байгууллагуудын дотор сантехникийн засвар, төвлөрсөн шугамд холбох ажил бүрэн дуусч 2021 оны 10 дугаар сарын 08-ны өдөр ашиглалтад хүлээн авсан.

ХҮҮХДИЙН ЗУСЛАНГИЙН ГАДНА ТОХИЖИЛТ, ГАДНА ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ АЖИЛ



Хүчин чадал: Хүүхдийн зуслангийн гадна тохижилт, гадна инженерийн шугам сүлжээний ажил /100 хүүхэд/

Гүйцэтгэгч: “Дэлгэр баясах зам” ХХК

Зураг төсөл зохиогч: “Шигота” ХХК

Гэрээний дүн: 698 819 517 төгрөг

Гэрээний эхлэх, дуусах огноо:
2020 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдөр
2021 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдөр

Ажлын явц: Гадна шугам сүлжээ, гадна тохижилтын ажил бүрэн дуусч комисс ажиллуулах хүсэлтээ ирүүлсэн.

Шугам
сүлжээ

АЛТАНШИРЭЭ СУМЫН ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГУУДЫГ ТӨВЛӨРСӨН ХАЛААЛТАД ХОЛБОХ АЖИЛ



Гүйцэтгэгч: “Чандмань-Илч” ХХК

Зураг төсөл зохиогч:

Гэрээний дүн: 54 973 400 төгрөг

Гэрээний эхлэх, дуусах огноо:

2021 оны 05 дугаар сарын 01

2021 оны 10 дугаар сарын 01

Ажлын явц: Төсөвт байгууллагуудыг төвлөрсөн халаалтад холбох ажил бүрэн хийгдэж дуусаж ашиглалтад хүлээн авах комисс 2021 оны 09-р сарын 08-ны өдөр ажилласан.

Барилгын
засвар

САЙНШАНД СУМЫН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 1-Р СУРГУУЛИЙН ДОТОР ХАЛААЛТ, ЦЭВЭР БОХИР УСНЫ САНТЕХНИКИЙН ЗАСВАРЫН АЖИЛ



Гүйцэтгэгч: “Аббадон констракшн” ХХК

Зураг төсөл зохиогч: “Шигота” ХХК

Гэрээний дүн: 694 653 041 төгрөг

Гэрээний эхлэх, дуусах огноо:

2021 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдөр

2021 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдөр



Ажлын явц: Сургуулийн барилга болон дотуур байрны дотор халаалт цэвэр бохир усны шугамын ажил хийгдэж дууссан. Барилгын засварын ажлыг ашиглалтад оруулах комисс 2021 оны 09-р сарын 22-ны өдөр ажилласан.

Барилгын
засвар

ЗАМЫН-ҮҮД СУМЫН НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН 2 ДУГААР ДАВХРЫН ИХ ЗАСВАРЫН АЖИЛ



Гүйцэтгэгч: “Аббадон констракшн” ХХК
Зураг төсөл зохиогч: “Шигота” ХХК
Гэрээний дүн: 173 681 233 төгрөг
Гэрээний эхлэх, дуусах огноо:
2021 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдөр
2021 оны 08 дугаар сарын 20-ны өдөр
Гэрээний сунгалт:
2021 оны 09 дүгээр сарын 25-ны өдөр

Ажлын явц: Барилгын засварын ажил бүрэн дуусч 2021 оны 09-р сарын 28-ны өдөр комисс ажиллаж ашиглалтад оруулсан.



Барилгын
засвар

САЙНШАНД СУМЫН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 2 ДУГААР СУРГУУЛИЙН ГАДНА ФАСАД, ДЭЭВРИЙН ЗАСВАРЫН АЖИЛ



Гүйцэтгэгч: “Тогоруутай нуур” ХХК

Зураг төсөл зохиогч: “Сант-Номун” ХХК

Гэрээний дүн: 223 471 904 төгрөг

Гэрээний эхлэх, дуусах огноо:

2021 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдөр

2021 оны 08 дугаар сарын 25-ны өдөр

Гэрээний сунгалт:

2021 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдөр

Ажлын явц: Барилгын гадна фасадны засвар, дээврийн ажил бүрэн дуусч, 2021 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдөр ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн.



Барилгын
засвар

САЙНШАНД СУМЫН 2 ДУГААР БАГИЙН ДЭНЖИЙН ГУДАМЖНЫ 111 ДҮГЭЭР БАЙРНЫ ДЭЭВЭР, ФАСАДНЫ ЗАСВАРЫН АЖИЛ



Гүйцэтгэгч: “Этүгэн жим” ХХК

Зураг төсөл зохиогч: “Сант-Номун” ХХК

Гэрээний дүн: 78 000 000 төгрөг

Гэрээний эхлэх, дуусах огноо:

2021 оны 04 дүгээр сарын 01-ны өдөр

2021 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдөр

Ажлын явц: Барилгын гадна фасад,
дээврийн ажил дуусч 2021 оны 06-р сард
ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн.

Барилгын
засвар

САЙНШАНД СУМЫН 1 ДҮГЭЭР БАГИЙН 30 АЙЛЫН ОРОН СУУЦНЫ БАРИЛГЫН ДЭЭВРИЙН ЗАСВАРЫН АЖИЛ



Гүйцэтгэгч: “Эргэл хийц” ХХК

Зураг төсөл зохиогч: “Сант-Номун” ХХК

Гэрээний дүн: 25 316 700 төгрөг

Гэрээний эхлэх, дуусах огноо:

2021 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдөр

2021 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдөр

Ажлын явц: Барилгын дээврийн засварын ажил дуусч 2021 оны 06-р сард ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн.

Гадна
ТОХИЖИЛТ

САЙНШАНД СУМЫН 2 ДУГААР БАГТ АВТОМАШИНЫ ЗОГСООЛ БАЙГУУЛАХ АЖИЛ



Гүйцэтгэгч: “Дэлгэр баясах зам” ХХК

Зураг төсөл зохиогч: “Архидеа” ХХК

Гэрээний дүн: 69 992 400 төгрөг

Гэрээний эхлэх, дуусах огноо:

2021 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдөр

2021 оны 07 дугаар сарын 01-ны өдөр



Ажлын явц: Автозогсоолын ажлыг
2021.07.02-нд ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн.

Барилгын
засвар

ИХХЭТ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН БАРИЛГЫН ИХ ЗАСВАРЫН АЖИЛ



Гүйцэтгэгч: “БЭМЭС” ХХК

Зураг төсөл зохиогч: “Сант-Номун” ХХК

Гэрээний дүн: 185 654 438 төгрөг

Гэрээний эхлэх, дуусах огноо:

2021 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдөр

2021 оны 08 дугаар сарын 20-ны өдөр

Гэрээний сунгалт:

2021 оны 09 дүгээр сарын 25-ны өдөр

Ажлын явц: Барилгын засварын ажил бүрэн дуусч 2021 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдөр комисс ажилласан.



Гүйцэтгэгч: “Ингүүмэл оргил” ХХК

Зураг төсөл зохиогч: “Алтайн газрын хүч” ХХК


Гэрээний дүн: 166 700 724 төгрөг

Гэрээний эхлэх, дуусах огноо:

2021 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдөр
2021 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдөр

Ажлын явц: Ажлын зураг төсөвт тусгагдсан гадна цэвэр усны 1087м, бохир усны 245м шугамын угсралтын ажил бүрэн дуусч ашиглалтад оруулах комисс 2021 оны 09-р сарын 17-ны өдөр ажилласан.

САЙНШАНД СУМЫН 3-Р БАГИЙН ГУДАМЖИНД ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМ ТАТАХ АЖИЛ

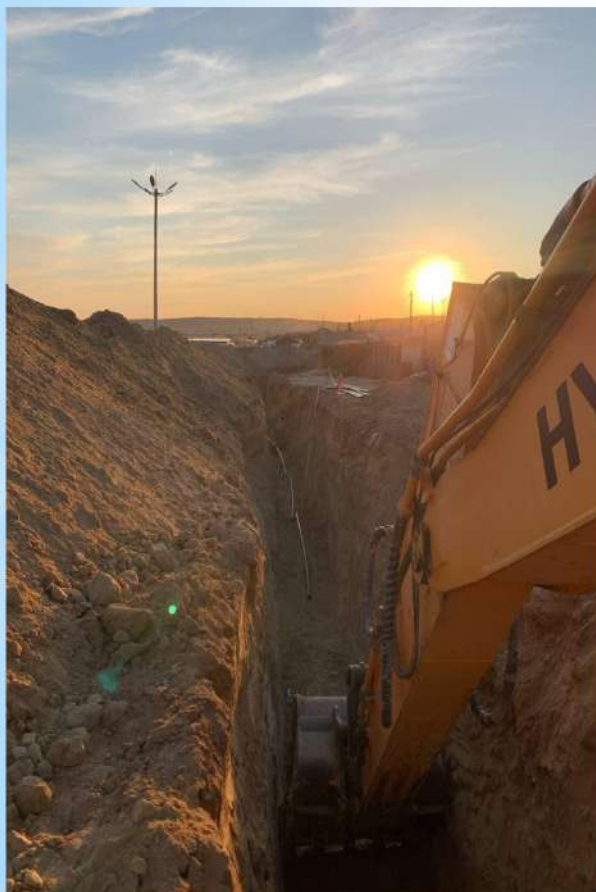

Гүйцэтгэгч: “Эгнэгт өрнөх” ХХК

Зураг төсөл зохиогч: “Алтайн газрын хүч” ХХК

Гэрээний дүн: 82 452 321 төгрөг

Гэрээний эхлэх, дуусах огноо:

2021 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдөр

2021 оны 09 дүгээр сарын 10-ны өдөр

Ажлын явц: Тогоотын 3, 7, 11, 16, 17, 18-р гудамжинд цэвэр усны шугам татах ажил бүрэн дуусч ашиглалтад оруулах комисс 2021 оны 09-р сарын 17-ны өдөр ажилласан.

Барилгын
засвар

АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН БАРИЛГЫН ГАДНА ФАСАД, ДОТОР ХАЛААЛТЫН ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ ЗАСВАРЫН АЖИЛ



Гүйцэтгэгч: “Ихэр түрүү” ХХК

Зураг төсөл зохиогч: “Сант номун” ХХК

Гэрээний дүн: 45 382 877 төгрөг

Гэрээний эхлэх, дуусах огноо:

2021 оны 08 дугаар сарын 05-ны өдөр

2021 оны 09 дүгээр сарын 20-ны өдөр

Ажлын явц: Барилгын гадна фасад, дотор халаалтын засварын ажлыг 2021 оны 09-р сарын 23-ны өдөр комисс ажилласан.

Барилгын
засвар

САЙХАНДУЛААН СУМЫН ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ИХ ЗАСВАРЫН АЖИЛ



Гүйцэтгэгч: “Эргэл хийц” ХХК

Зураг төсөл зохиогч: “Архидаа” ХХК

Гэрээний дүн: 65 484 263 төгрөг

Гэрээний эхлэх, дуусах огноо:

2021 оны 08 дугаар сарын 10-ны өдөр

2021 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдөр



Ажлын явц: Барилгын засварын ажил бүрэн дуусч 2021 оны 10-р сарын 21-ны өдөр комисс ажилласан.



Гүйцэтгэгч: “Энержи парагон” ХХК

Зураг төсөл зохиогч: “Сант номун” ХХК

Гэрээний дүн: 185 484 263 төгрөг

Гэрээний эхлэх, дуусах огноо:

2021 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдөр

2021 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдөр

Ажлын явц: Барилгын засварын ажил бүрэн дууссан. Ашиглалтад хүлээлгэн өгөх хүсэлтээ хүргүүлсэн.



Хүчин чадал: 30 Ортой халдвартын эмнэлэг, Угаалга ариутгалын барилга

Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэгч: “Төгс-Өнөд” ХХК

Зураг төсөл зохиогч: “Хатанбаатар” ХХК

Гэрээний дүн: 2 181 306 005 + 484 559 266 төгрөг

Гэрээний эхлэх, дуусах огноо:

2020 оны 09 дүгээр сарын 10-ны өдөр

2021 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдөр

Ажлын явц: Эмнэлгийн барилгын үндсэн хийц бүтээц, гадна дотор халаалт, цэвэр бохир усны шугам сүлжээ, дотор цахилгаан, холбоо дохиололын ажлууд бүрэн хийгдсэн, дотор заслалын өнгө будагны ажлууд үргэлжлэн хийгдэж байна. Дээвэр, гадна фасадны ажил бүрэн хийгдсэн. Эмнэлэгийн зориулалттай хулдаасан шалны материал БНХАУ-д захиалагдсан боловч хил гааль хаагдсантай холбоотойгоор орж ирэх боломжгүй удаахрах нөхцөл байдал үүсээд байна. Угаалга ариутгалын барилгын гадна фасад хийгдсэн, дотор шавардлага, заслалын ажлууд үргэлжлэн хийгдэж байна. Мөн гадна тохижилт, цэвэрлэх байгууламжийн ажил хийгдэж байна.



Хүчин чадал: 640 хүүхдийн сургууль, гадна шугам сүлжээ, тохижилтын ажил

Гүйцэтгэгч: “Болор-Аграмба” ХХК

Зураг төсөл зохиогч: “Шигота” ХХК

Гэрээний дүн: 4 968 888 888 + 2 753 722 222 төгрөг

Гэрээний эхлэх, дуусах огноо:

202 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдөр

2021 оны 08 дугаар сарын 20-ны өдөр

Ажлын явц: Барилгын Б,В,Г,Д блокын карказын төмөр бетон хийцийн угсралтын ажил бүрэн хийгдсэн. Спорт заал, соёлын танхимын металл каркас, сендвич хучилт хийгдсэн, 1-3 дугаар давхрын гадна, дотор ханын өргийн ажил, цонх суулгах ажил, шалны бетон тэгшилгээний цутгалтын аил хийгдэж байна. Гадна шугам сүлжээний ажлын цэвэр бохир усны төв магистрал шугамд холбох ажил хийгдэж дууссан. Дулааны шугам сүлжээний өргөтгөлийн хэсгийн ажил хийгдсэн, шинээр хийгдэх шугамын сувгийн цутгалтын ажлууд үргэлжлэн хийгдэж байна.

ХӨВСГӨЛ СУМЫН ТӨВИЙН ТӨВЛӨРСӨН ДУЛААН, ЦЭВЭР, БОХИР УСНЫ ШУГАМ СҮЛЖЭЭ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ БАРИХ АЖИЛ



Хүчин чадал: Уг инженерийн шугам сүлжээний ажил нь гадна дулаан, цэвэр усны шугам сүлжээ, ариутгах татуургын шугам, цэвэрлэх байгууламж, уурын зуухны барилга, 100м³ усан сан, ус түгээх байр, гүний худаг, бохир усны насос станц

Гүйцэтгэгч: “Б СОФТ” ХХК

Зураг төсөл зохиогч: “Мон Кузбасс” ХХК

Гэрээний дүн: 3 852 117 138 төгрөг

Гэрээний эхлэх, дуусах огноо:

2020 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдөр

2020 оны 12 дугаар сарын 31-ны өдөр

Гэрээний сунгалт:

2021 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдөр

Ажлын явц: Гадна дулаан цэвэр бохир усны нэгдсэн шугам сүлжээний угсралтын ажил, цэвэрлэх байгууламж, усан сангийн ажлууд хийгдэж дууссан. Халаалтын зуухны барилгад ус зөөлрүүлэгч суурилуулах, газардуулга, аяга зайлуулагч, хянах хэмжих хэрэгсэл суурилуулах, шугам хоолойн дулаалга, ариун цэврийн өрөөний тоноглол зэрэг хийгдээгүй байна. Усан сангийн доторлогоо, гүний худгийн өрөмдлөгө, насос суурилуулах, худгийн барилгын дотор заслал хийх, Бохир усны насос станцын тоноглол суурилуулах, дотор заслал дээврийн ажлууд хийгдээгүй байна.

Шугам
сүлжээ

ХӨВСГӨЛ СУМЫН ТӨВИЙН ТӨВЛӨРСӨН ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ ГАДНА ЦАХИЛГААНЫ ШУГАМ ТАТАХ АЖИЛ



Хүчин чадал: Уг инженерийн шугам сүлжээний ажил нь гадна дулаан, цэвэр усны шугам сүлжээ, ариутгах татуургын шугам, цэвэрлэх байгууламж, уурын зуухны барилга, 100м³ усан сан, ус түгээх байр, гүний худаг, бохир усны насос станц

Гүйцэтгэгч: “СМАРТ КРАФТ” ХХК

Зураг төсөл зохиогч: “Электросет проект” ХХК

Гэрээний дүн: 165 440 996 төгрөг

Гэрээний эхлэх, дуусах огноо:

2021 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдөр

2021 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдөр

Ажлын явц: Гадна шугам сүлжээний трассын дагуу бетон тулгуур суурилуулах, ЦДАШ дамжуулах 0.4/10кВ-ын сип утас татах ажлууд хийгдэж дууссан. Гадна цахилгааны КТПН суурилуулах тоноглох ажил хийгдэж байна.

ХӨВСГӨЛ СУМЫН ТӨВИЙН ТӨВЛӨРСӨН ДУЛААН, ЦЭВЭР, БОХИР УСНЫ ШУГАМ СҮЛЖЭЭ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ БАРИХ АЖИЛ



Хүчин чадал: Уг инженерийн шугам сүлжээний ажил нь гадна дулаан, цэвэр усны шугам сүлжээ, ариутгах татуургын шугам, цэвэрлэх байгууламж, уурын зуухны барилга, 100м³ усан сан, ус түгээх байр, гүний худаг, бохир усны насос станц

Гүйцэтгэгч: “Б СОФТ” ХХК

Зураг төсөл зохиогч: “Мон Кузбасс” ХХК

Гэрээний дүн: 3 852 117 138 төгрөг

Гэрээний эхлэх, дуусах огноо:

2020 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдөр

2020 оны 12 дугаар сарын 31-ны өдөр

Гэрээний сунгалт:

2021 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдөр

Ажлын явц: Гадна дулаан цэвэр бохир усны нэгдсэн шугам сүлжээний угсралтын ажил, цэвэрлэх байгууламж, усан сангийн ажлууд хийгдэж дууссан. Халаалтын зуухны барилгад ус зөөлрүүлэгч суурилуулах, газардуулга, аяга зайлуулагч, хянах хэмжих хэрэгсэл суурилуулах, шугам хоолойн дулаалга, ариун цэврийн өрөөний тоноглол зэрэг хийгдээгүй байна. Усан сангийн доторлогоо, гүний худгийн өрөмдлөгө, насос суурилуулах, худгийн барилгын дотор заслал хийх, Бохир усны насос станцын тоноглол суурилуулах, дотор заслал дээврийн ажлууд хийгдээгүй байна.

ЦЭВЭРЛЭХ
БАЙГУУЛАМЖ

САЙНШАНД СУМЫН ЦЭВЭРЛЭХ БАЙГУУЛАМЖ БОЛОН БУСАД ТУСЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖИЛ



Хүчин чадал: Хоногт 3000м³ ус цэвэрлэх хүчин чадалтай

Гүйцэтгэгч: “Комфорт импекс” ХХК

Зураг төсөл зохиогч: “Хайдро дизайн прожект” ХХК

Гэрээний дүн: 6 350 870 894 төгрөг

Гэрээний эхлэх, дуусах огноо:

2021 оны 03 дугаар сарын 09-ны өдөр

2021 оны 12 дугаар сарын 31-ны өдөр

Ажлын явц: Биологи цэвэрлэгээний барилга, үйлдвэрийн байр, сараалжийн барилга, лаг хатаах барилга, уурын зуух, харуулын байр зэрэг барилгуудын үндсэн хийц бүтээцийн ажлууд хийгдэж дууссан. Мөн гадна шугам сүлжээ шороон далан байгууламжийн ажлууд дууссан. Барилга байгууламжуудын дотор заслал, уурийн зуухны барилгад зуух суурилуулах, утааны яндан угсрах, усны нөөц сав суурилуулах, Биологи цэвэрлэгээний байгууламжийн хучилтын метал төмөр каркас угсрах, лагийн талбайн ханын цутгалтын ажил хийгдэж байна.
